

出雲斐川インター企業団地整備事業の進捗状況について

令和 3 年度から実施している出雲斐川インター企業団地整備事業の進捗状況等について、下記のとおり報告します。

記

1. 事業の進捗状況

(1) 造成工事 (令和 6 年 2 月末現在) 【進捗率：13.3% (予定工程 12.7%)】

令和 5 年 7 月に着工し、伐採等の準備工を終え、現在、丘陵部の掘削、谷部への盛土等を中心に施工しています。また、先行して調整池整備を進めています。

(2) 道路改良工事

企業団地内の道路改良工事 (市道 100 号線) は、令和 6 年度に別途工事発注し、造成工事の進捗に合わせ、令和 7 年度にかけて施工する予定です。

(3) 文化財調査

現地調査が令和 5 年 8 月に完了し、現在、出土物等の整理作業を行っています。令和 6 年度中に報告書を発刊する予定です。

(4) 西谷川改修工事 (関連工事)

西谷川下流の流下能力の向上を図る河川改修工事は、今年度完了する予定です。

(5) 市道 610 号線道路改良工事 (関連工事) にかかる用地取得

市道 610 号線 (ロマン街道) の付加車線整備箇所の用地取得については、年度内の土地売買契約締結に向け、手続きを進めています。

2. 令和 6 年度以降のスケジュール


	令和 6 年度				令和 7 年度			
文化財調査								
造成工事								
道路改良工事 (敷地内)								
関連工事								
用地確定測量								

※造成工事 令和 5 年度～7 年度 継続費 1,280,000 千円

※文化財調査 令和 3 年度～6 年度 継続費 280,000 千円

※関連工事 市道 610 号線道路改良工事、道路照明設置工事、防犯灯設置工事、植樹帯撤去工事 等

関連工事位置図

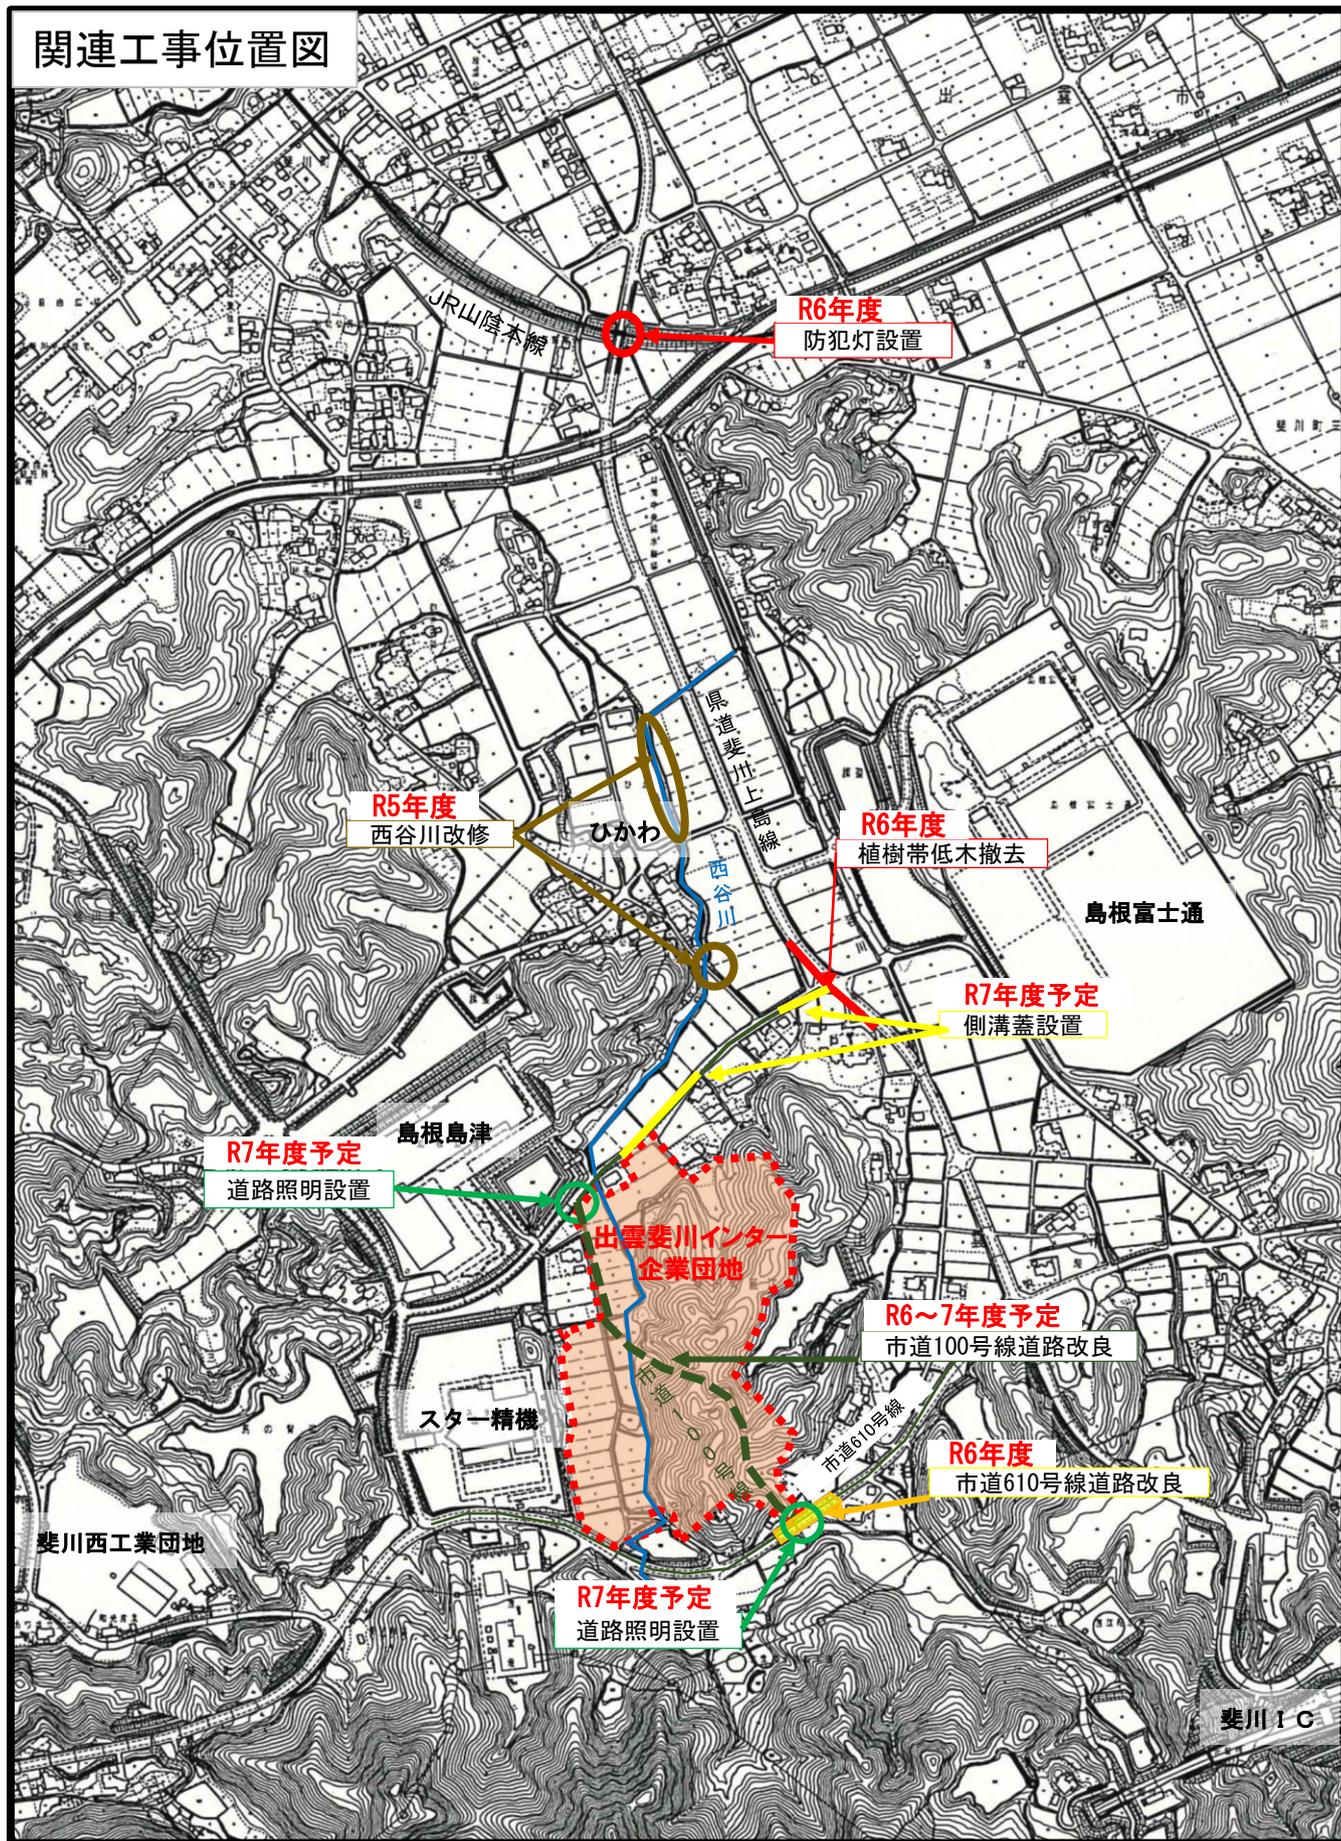

○造成工事進捗状況（令和6年2月末現在）



区画1, 2



区画2, 3, 4, 5

北側上空から南方面



○完成イメージ図（令和8年3月）

北側上空から南方面

