

## 学校施設建築工事の進捗状況について

継続費を設定して実施中である学校施設建築工事の進捗状況について、報告します。

### 1. 対象工事

- (1)今市小学校北校舎改築建築主体工事……(令和5年度～令和6年度)
- (2)大津小学校屋内運動場改築建築主体工事…(令和5年度～令和6年度)
- (3)旅伏小学校校舎建築工事………(令和5年度～令和6年度)
- (4)旅伏小学校屋内運動場他建築工事………(令和5年度～令和6年度)

### 2. 進捗状況


#### (1)今市小学校北校舎改築建築主体工事

- ①工事概要：老朽化し耐震性が劣る既設北校舎にかわる新北校舎を建築する。
- ②契約金額：776,050,000円
- ③工 期：令和5年9月2日から令和6年9月30日
- ④契約の相手方：御船組・内藤組・小林建設特定建設工事共同企業体
- ⑤進捗状況：杭工事が完了し、基礎の配筋工事に着手しました。  
1月末現在の進捗率：実績12.3% (計画10.8%)

施工状況写真 (令和6年1月末現在)



【南西から撮影】

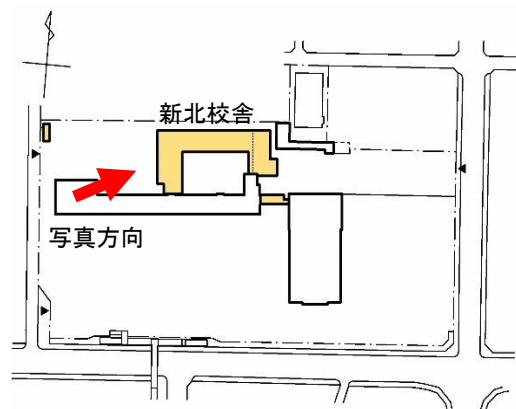

## (2)大津小学校屋内運動場改築建築主体工事

- ①工事概要：老朽化し耐震性が劣る既設屋内運動場にかわる新屋内運動場を建築する。
- ②契約金額：919,600,000円
- ③工 期：令和5年9月2日から令和6年9月30日
- ④契約の相手方：内藤建設工業・浜村建設・岩崎建設特定建設工事共同企業体
- ⑤進捗状況：杭工事及び基礎コンクリートの打設が完了し、埋め戻しを行います。  
1月末現在の進捗率：実績22.0%（計画22.0%）

施工状況写真（令和6年1月末現在）



## (3)旅伏小学校校舎建築工事

- ①工事概要：国富小、西田小、鰐淵小、北浜小学校の4校統合による新設校「旅伏小学校」の校舎を建築する。
- ②契約金額：1,100,000,000円
- ③工 期：令和5年7月7日から令和7年1月30日
- ④契約の相手方：昭和開発工業・中筋組・アールズシステム・佐藤工務店  
特定建設工事共同企業体
- ⑤進捗状況：杭及び基礎工事が完了し、1階床の配筋工事中です。  
1月末現在の進捗率：実績27.2%（計画27.2%）

施工状況写真（令和6年1月末現在）



#### (4)旅伏小学校屋内運動場他建築工事

- ①工事概要：国富小、西田小、鰐淵小、北浜小学校の4校統合による新設校「旅伏小学校」の屋内運動場を建築する。
- ②契約金額：721,600,000円
- ③工期：令和5年9月7日から令和7年2月20日
- ④契約の相手方：今岡工業・昭和開発工業・御船組特定建設工事共同企業体
- ⑤進捗状況：杭工事が完了し、基礎の配筋工事中です。  
1月末現在の進捗率：実績19.0%（計画13.0%）

施工状況写真（令和6年1月末現在）

