

旧出雲エネルギーセンター解体工事の進捗状況について

1 工事請負契約概要

契約金額 : 1, 317, 800, 000円

契約工期 : 令和4年12月22日から令和7年2月28日まで

契約相手方 : 鴻池組・中筋組・ヒロシ特定建設工事共同企業体

代表者 松江市殿町516番地

株式会社 鴻池組 山陰支店 執行役員支店長 庄谷昌久

2 敷地面積


施設用地 : 17,500 m² 資材置場 : 3,150 m² 駐車場 : 2,360 m² 合計 : 23,010 m²

3 工事進捗状況

令和5年3月に現場着手した旧出雲エネルギーセンター解体工事は、付属棟、工場棟及び煙突の解体を終え、現在は工場棟基礎及びごみピット地下構造物の解体を進めており、令和6年11月には外構の解体に着手する予定です。併せて、跡地の活用を見据えた地籍調査を進めています。

〔工事スケジュール〕

	令和5年(2023)												令和6年(2024)												令和7年	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
工事計画																										
環境調査																										
仮設工事																										
アスベスト除去																										
ダイオキシン類除去																										
プラント設備解体																										
建物解体																										
外構解体・片付																										

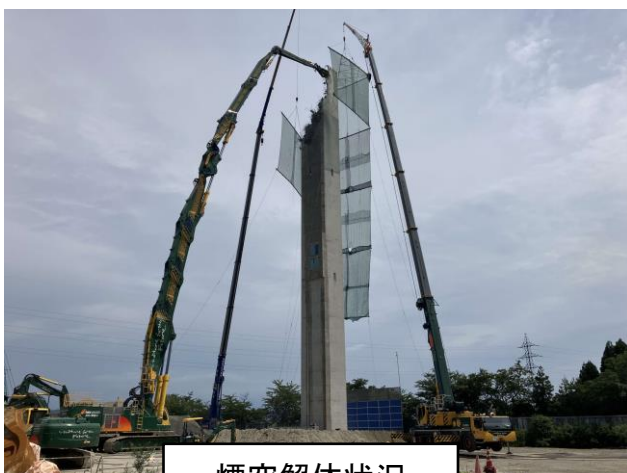

煙突解体状況



ごみピット地下構造物解体状況
