

西野小学校校舎増築建築工事の進捗状況について


継続費を設定し、令和7年度から8年度にかけて実施中である西野小学校校舎増築建築工事の進捗状況について報告します。

1. 工事概要 普通教室不足対策のため校舎を増築する。
2. 契約金額 454,300,000円
3. 工 期 令和7年7月1日から令和8年9月25日
4. 契約の相手方 フクダ・出雲グリーン工業・佐藤工務店 特定建設工事共同企業体
5. 進捗状況（令和8年1月末） 進捗率 41%（計画40%）

校舎棟 鉄骨工事が完了し、屋根及び外壁工事に着手しました。

職員室 外装工事が完了し、内装工事に着手しました。

6. 施工状況写真（令和8年1月末時点）

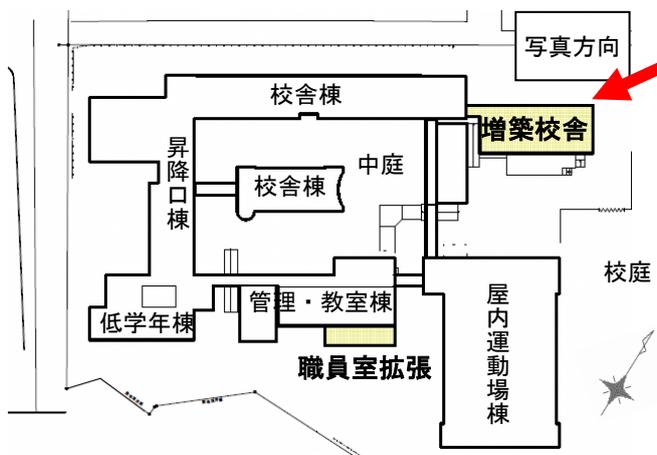

増築校舎外観
