

次期可燃ごみ処理施設整備事業の進捗状況について

次期可燃ごみ処理施設については令和4年4月からの本稼動に向け、本年10月から施設本体の建設工事に着手しました。


周辺事業も含めて、現在の進捗状況について下記のとおり報告します。

記


1. 本体建設工事

本年度は建屋を支える基礎部分の杭工事とごみを溜めるごみピット部分の掘削を行います。令和2年度以降は建屋の建設に取り掛かり、順次、ごみ焼却炉や蒸気タービン発電機等のプラント機器の据え付けを行っていきます。全体配置図及び各階の平面図は次のとおりです。


全体配置図

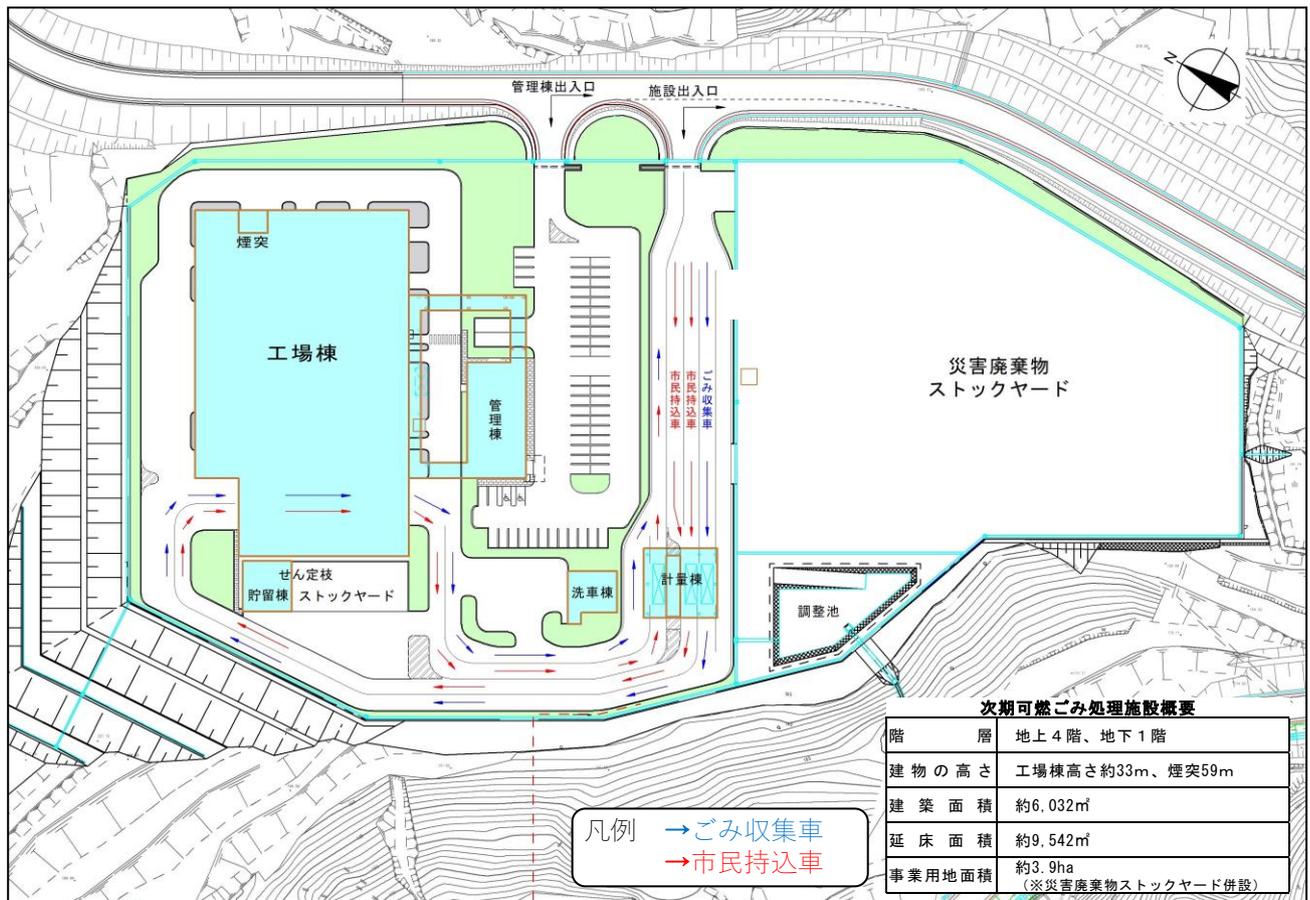

1階平面図

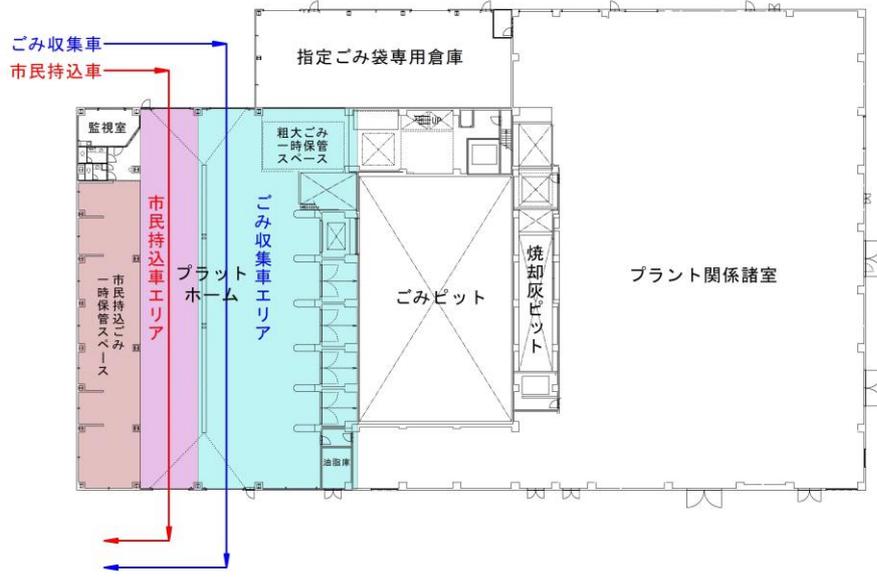

2階平面図

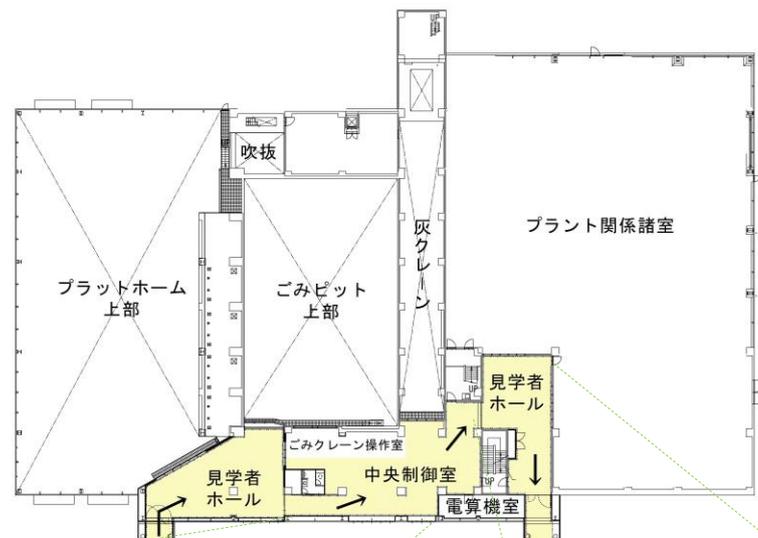

【中央制御室】




【見学者ホール】




プロジェクション・マッピング

3 階平面図

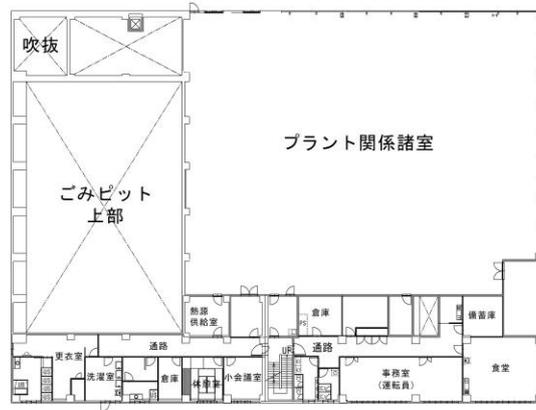

4 階平面図

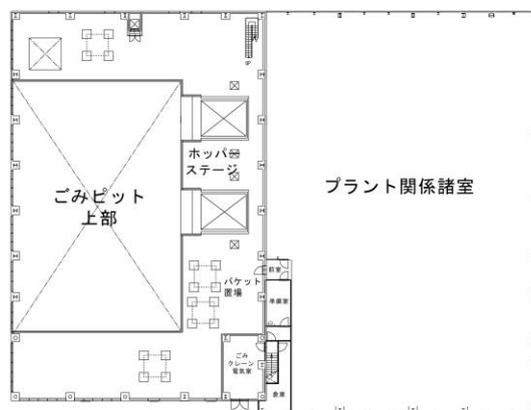

2. 造成工事・古志86号線外道路改良工事

(1) 敷地造成工事

ドローンによる測量や、人工衛星からの位置情報を基に効率よく掘削できる建設機械を用いるなど、最新技術による施工の結果、令和元年7月に予定造成高までの整地を完了しました。令和2年1月中には、外構・調整池など全ての工事を完了予定です。

(2) 古志86号線外道路改良工事

道路改良工事について、今議会に提案している2工区の契約をもって全6工区の道路改良工事の発注が完了します。

今後、道路改良工事の進捗に応じて、順次、給水管敷設、舗装工事に着手し、令和3年秋頃の全線開通を目指します。

3. 周辺整備事業

	要望事項	実施状況
1	上新宮町内生活道路の新設及び整備	生活道路整備手法について協議中
2	古志スポーツセンターグラウンド及び駐車場の拡張	令和元年度：測量・設計実施中 令和2年度～：用地買収、造成工事（予定）
3	古志コミュニティセンターの駐車場舗装及び施設整備	平成30年12月：駐車場舗装工事完成 令和元年度：施設整備工事実施中
4	下新宮地内通学路の整備	平成30年12月：一部区間完成 残りの区間は令和元年12月末完成予定
5	下新宮公会堂建て替え	令和2年度実施予定（補助事業）
6	宇賀集会所施設改修	令和元年8月完成（補助事業）
7	新宇賀集会所施設改修	令和元年7月完成（補助事業）
8	簸川南広域農道畜産試験場入口(横断歩道)より西へ約40mの通学路新設	平成31年4月完成
9	思案橋集会所建て替え	令和元年9月完成（補助事業）

