

次期可燃ごみ処理施設整備事業の進捗状況について

次期可燃ごみ処理施設については、令和4年4月からの本稼動に向けて施設本体の建設工事を進めています。

アクセス道路工事及び周辺整備を含め、現在の進捗状況について下記のとおり報告します。


記

1. 本体建設工事について

工場棟及びごみピットは地上部分の建設を進めており、並行してごみクレーン等のプラント機器の据え付けを行っています。プラットフォームは基礎工事を進めています。また、別棟の管理棟は建屋の建設に着手したところです。

令和3年10月に試運転へ移行し、翌11月にはごみ搬入の受け入れを開始する予定です。

〔建設現場写真〕

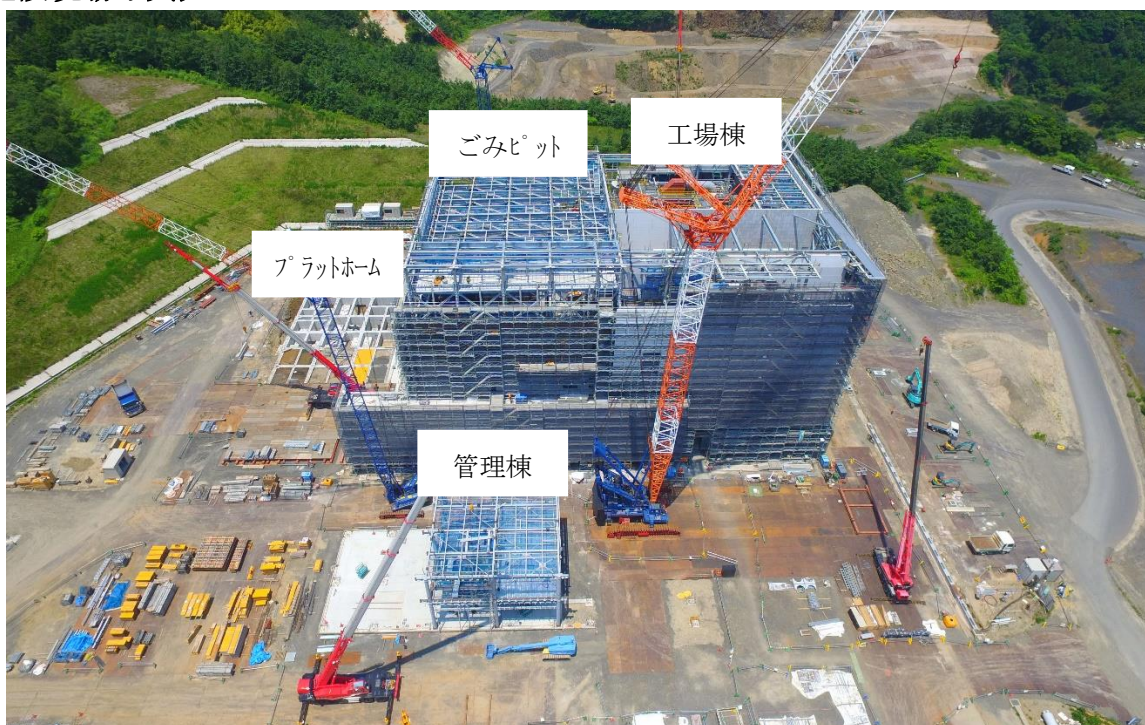

(R3.6 撮影)

2. 次期可燃ごみ処理施設の正式名称について

正式名称については、現在の可燃ごみ処理施設の名称が幅広く市民に定着していることから同じ名称を引き継いで「出雲エネルギーセンター」にすることとしました。

3. アクセス道路工事（市道古志86号線外道路改良工事）について

ごみ搬入受け入れを開始する令和3年11月の開通を目指し、道路改良工事等を進めています。各工区の進捗状況は次のとおりです。今後予定工事についてはすべて契約済みです。

工区	延長	現在の状況	今後予定工事
1工区	108m	H31.4完成、供用開始済	
2工区	513m	道路改良工事実施中	水道管布設工事、舗装工事
3工区	200m	R3.3完成	
4工区	560m	R3.3完成	
5工区	458m	道路改良工事及び法面工事実施中	水道管布設工事、舗装工事
6工区	500m	道路改良工事及び法面工事完了	舗装工事
合計	2,339m		

〔5工区起点側からの写真〕



(R3.6撮影)

4. 周辺整備について

	要望事項	実施状況
1	上新宮町内生活道路新設及び整備	整備手法について協議中
2	古志スポーツセンターグラウンド及び駐車場拡張	令和2年度 測量調査・設計及び用地買収完了 令和3年度 敷地造成工事等実施中
3	地元3町内会合同集会所整備(神戸川会館跡地)	令和4年度実施予定(補助事業)
4	古志コミュニティセンター施設整備及び駐車場舗装	令和元年度完了
5	下新宮地内通学路整備	令和元年度完了
6	簸川南広域農道畜産試験場入口西通学路新設	令和元年度完了
7	下新宮公会堂建替え	令和2年度完了(補助事業)
8	宇賀集会所施設改修	令和元年度完了(補助事業)
9	新宇賀集会所施設改修	令和元年度完了(補助事業)
10	思案橋集会所建替え	令和元年度完了(補助事業)
